



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

GENNAIO 2019

07.01-10.01.19

Riapertura cantiere.


Completati tagli e rimozione calcestruzzo bacino combinato, innesto tubazioni tra NMS e bacino.



Istallazione scale NMS

Rimozione pavimentazione nella zona interessata al taglio della soletta sul bacino combinato.






14.01-18.01.19

Deviazione flusso per realizzare la nuova guscia, in corso lavori previsti nel bacino combinato




Completamento scavo, tracciamento e verifica del geometra del nuovo stabile blocco A.
Posa infrastrutture sottoplatea, realizzazione del magrone con relativi elementi passanti e posa ferro d'armatura della platea.





21.01-25.01.19

In corso lavori di modifica del VMS e del bacino combinato.

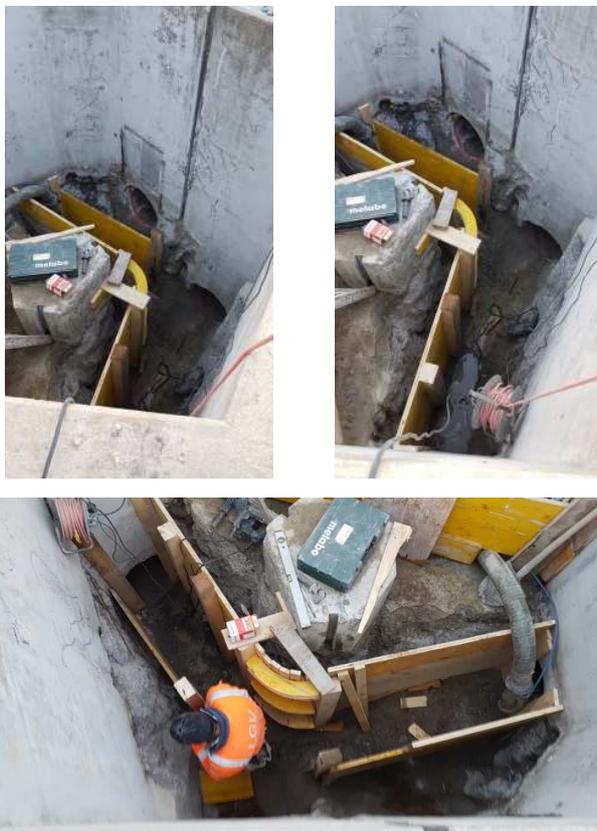

Terminata la platea nuovo edificio blocco A e in corso i lavori per le elevazioni piano cantina.

