

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

FEBBRAIO 2019

28.01-01.02.19

Realizzata guscia VMS




Eseguito getto elevazioni piano cantina Blocco A



04.02-08.02.19

Completata tratta di canalizzazione tra NMS e bacino acque di pioggia.





Eseguito getto delle elevazioni nuovi accessi bacino combinato




In corso lavori per la soletta piano terreno blocco A.




Scavo in corrispondenza del nuovo cunicolo di collegamento e demolizione raccordo allo stabile attuale





11.02-15.02.19

Montato cartellone di cantiere

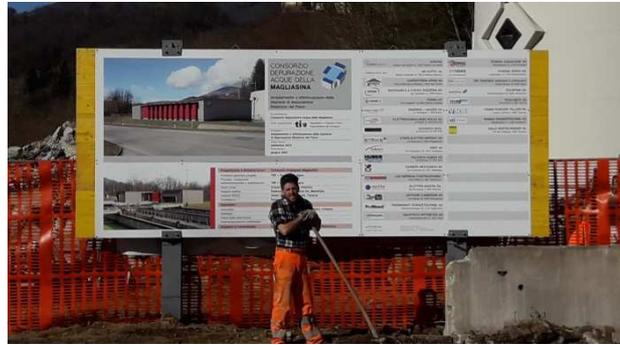

Realizzato piano di posa del cunicolo, avanzamento lavori del cunicolo di collegamento



Getto della soletta piano terreno blocco A e in corso elevazioni sopra il piano terreno.




Realizzazione cassero scala interna nuovo edificio blocco A





18.02-22.02.19

Inizio lavori di montaggio della struttura del nuovo gasometro.

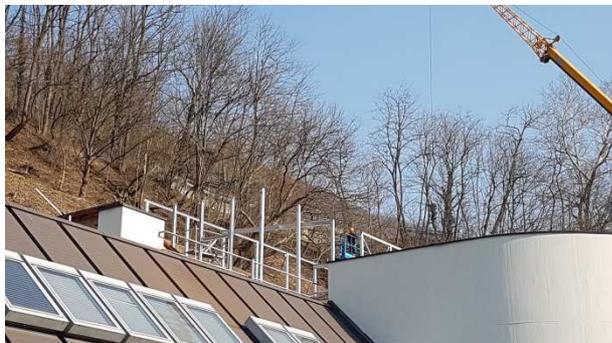

Eseguito getto platea cunicolo e parete a ridosso del bacino combinato.



Eseguito getto scala blocco A ed in corso pareti perimetrali.

