


PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE


ESECUZIONE LAVORI

APRILE 2019

01.04-05.04.19

Avanzamento lavori nuovo dissabbiatore

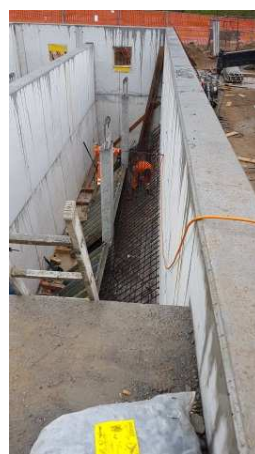



Eseguite elevazioni canale di sfioro, bettoncino di fondo e posa lastre per soletta.




08.04-12.04.19

Tracciamento ed inizio posa tubazione Ø250mm dietro il blocco A.



Avanzamento lavori dissabbiatore.





15.04-19.04.19

Terminato la posa della canalizzazione Ø250 in direzione delle viti di sollevamento.




In esecuzione lavori dissabbiatore.



Terminati lavori del canale di sfioro della decantazione primaria





Preparazione per blocco B



23.04-26.04.19

Posa armatura travi, e soletta blocco B



Completati getti delle pareti del dissabbiatore

