



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

OTTOBRE 2019


30.09-04.10.19

Getto prima tappa elevazioni omogeneizzatore e posa casseri seconda tappa



Sottocolatura carpenteria metallica





Deposito struttura capannone




07.10-11.10.19

Continuazione elevazioni omogeneizzatore e posa passo duomo.



Rimozione cupola digestore 1.





14.10-18.10.19


Montaggio griglie fini




Inizio smontaggio e sabbiatura vasca decantazione primaria 1



Taglio vecchi basamenti e apertura passaggi a omogeneizzatore

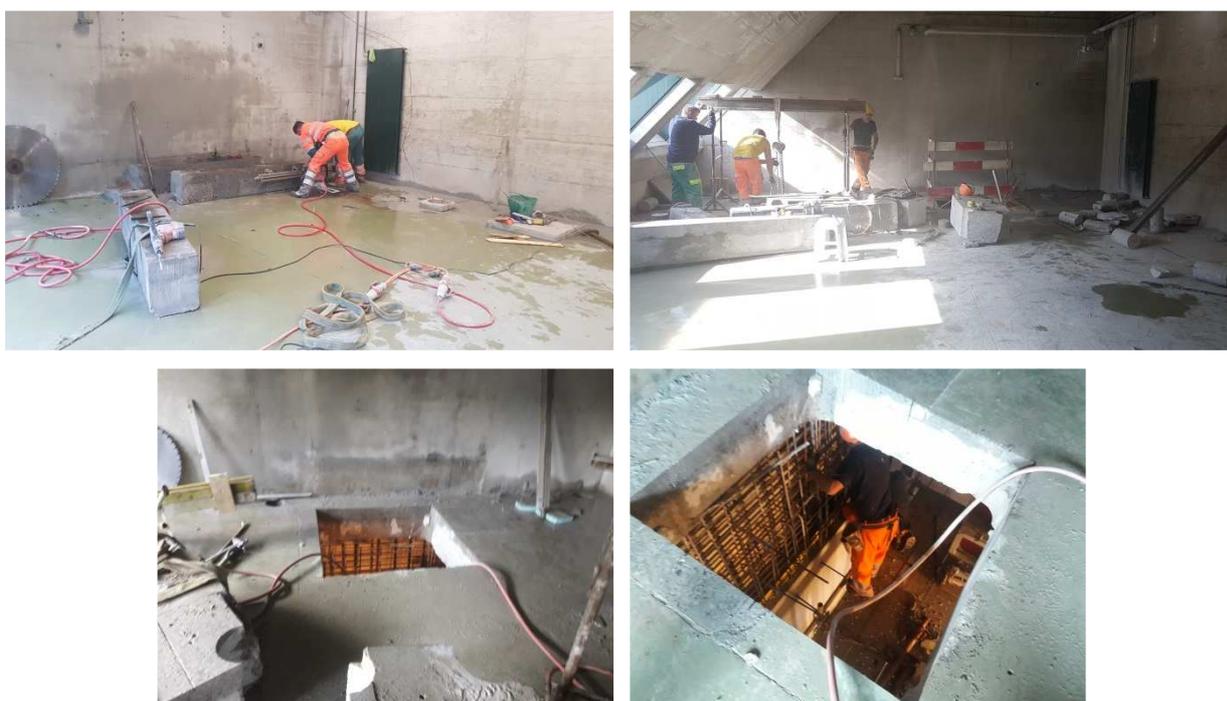



Continuazione elevazioni omogeneizzatore



Inizio montaggio struttura in legno del nuovo stabile




21.10-25.10.19

Sabbatura vasca decantazione primaria 1 e riparazione crepe.



Getto ultima tappa elevazioni omogeneizzatore





Istallazione ponteggio nel digestore 1



Montaggio struttura nuovo stabile




28.10-01.11.19

Inizio rivestimento bacino decantazione primaria 1



Terminato ponteggio digestore 1





Montaggio nuovo stabile

