


PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

NOVEMBRE 2019

04.11-08.11.19

Continuazione risanamento decantazione primaria 1, rimozione vecchie tubature e carotaggi.

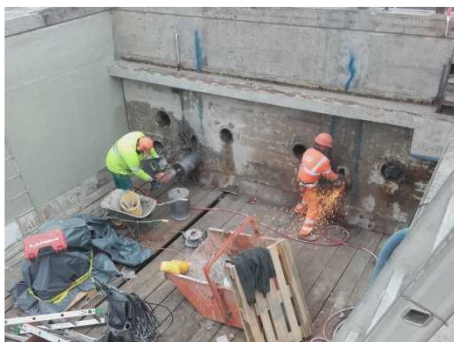


Preparazione basamenti nel locale del trattamento gas




Continuazione montaggio capannone






11.11-15.11.19

Rimozione tubazioni digestore.

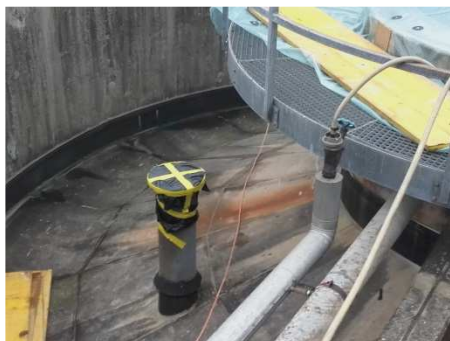

Inizio montaggio filtri trattamento gas

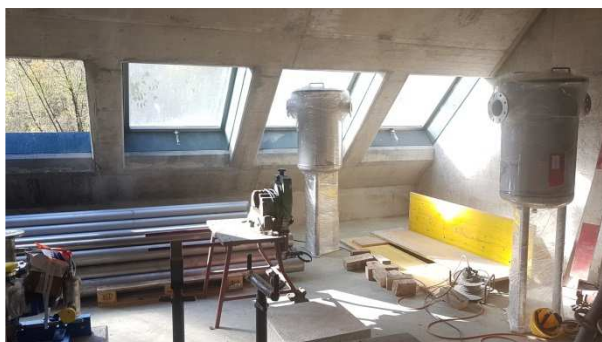


Terminato elevazioni interne all'omogeneizzatore



Continuazione capannone e installazione supporti quadri elettrici





18.11-22.11.19

Carotaggi vasca decantazione primaria




Continuazione montaggio trattamento gas



Getto platea omogeneizzatore





Basamenti per macchinari nel nuovo stabile




Continuazione nuovo stabile



25.11-29.11.19

Carotaggi e passaggi murali tra gasometro e stabile.





Posizionamento nuove pompe, primi quadri elettrici e continuazione montaggio nuovo stabile

