

# PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

## ESECUZIONE LAVORI

FEBBRAIO 2020

03.02-07.02.20


Nuovo tracciato elettrico e tubazioni acque meteoriche




Montaggi gasometro



Montaggi interni nuovo stabile

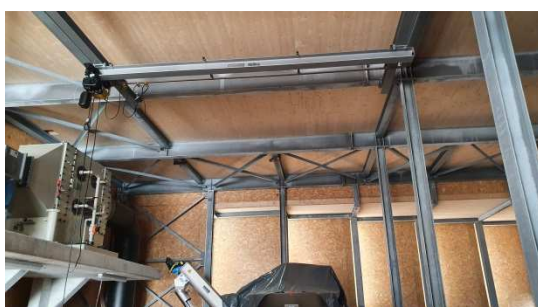



### Proseguimento montaggio nuovo stabile



### Smontaggio vecchi serbatoi agenti defosfatanti




### **10.02-14.02.20**

### Nuovi tracciati elettrici e canalizzazioni acque meteoriche







### Montaggi gasometro



### Avanzamento nuovo stabile




### Vuotatura biologia linea 2 per adattamenti provvisori



### **17.02-21.02.20**

### Nuovi tracciati elettrici e canalizzazioni acque meteoriche





### Montaggio griglie grosse, carro decantazione primaria




### Adattamento provvisorio aria biologia linea 2




### Sistemazione scala accesso trattamento gas



### Montaggio pallone gasometro

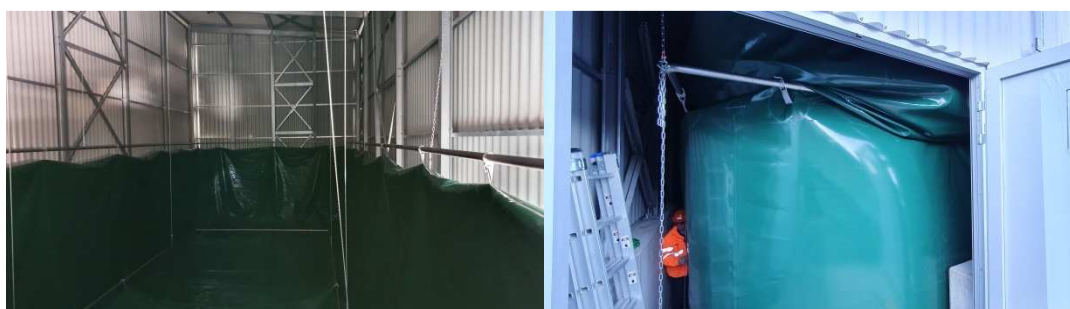





**24.02-28.02.20**

Riempimento biologia linea 2



Avanzamento linee elettriche nuove



Getto nuova scala accesso trattamento gas



Continuazione montaggi

