

# PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

## ESECUZIONE LAVORI

LUGLIO 2020

**29.06-03.07.20**

Lavori all'interno della decantazione finale, rimozione canale uscita e parte del bettoncino




Tubi di sfiato locale trattamento gas



Proseguimento montaggi RVCS e cablaggi elettrici








**06.07-10.07.20**

**Montaggi decantazione primaria**




**Avanzamento lavori sulla linea 1 biologia e decantazione finale**

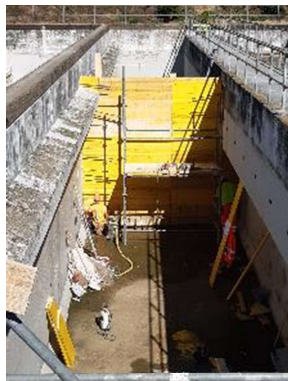

**Posizionamento pompa provvisoria per centrifuga**







**Smontaggio e spostamento**




**13.07-17.07.20**

**Avanzamento lavori sulla linea 1 biologia e decantazione finale**







**Modifiche per posizionamento nuova cupola digestore 1**




**Posa bettoncini blocco B**



**Posa soppalco sopra nuovo dissabbiatore**







**20.07-24.07.20**


Platea fronte blocco C e montaggio binari benne




Continuazione lavori sulla linea 1 biologia e decantazione finale



Modifiche, posizionamento e getto nuova cupola digestore 1

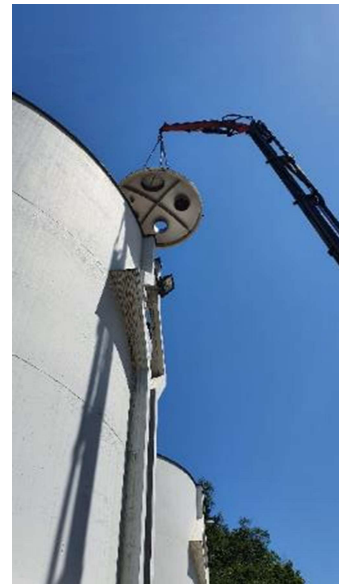





**27.07-31.07.20**

Sottocolature binari benne



Continuazione lavori sulla linea 1 biologia e decantazione finale

