



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

MARZO 2021


01.03-05.03.21

Smontaggio vecchio locale griglie



Montaggi linee elettriche e acqua esterne





08.03-12.03.21

Avanzamento canale uscita dissabbiatore, canale entrata pretrattamenti



Continuazione demolizioni e modifiche per vano montacarichi




Test insufflazione biologia



Montaggi linee elettriche e acqua esterne





15.03-19.03.21

Riempimento biologia e decantazione finale con acqua per test




Continuazione modifiche per vano montacarichi



22.03-26.03.21

Inizio messa in esercizio nuova biologia e decantazione finale linea 1

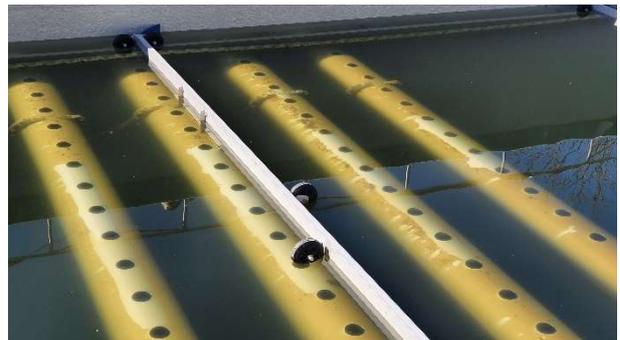



Risanamento canale entrata viti di sollevamento



Avanzamento posa condotte e tubazioni all'esterno della decantazione finale



29.03-02.04.21

Avanzamento vano montacarichi



Rivestimento nuovo cunicolo

